AUTOCONTROLE DE PULVERISATEURS EN VITICULTURE

Fiche de réglage annuel VITI+

1. Renseignements généraux:

Détenteur		**Pulvérisateur / buses**		**Indication de l'utilisateur**	
Nom	.....	Pulv. marque/fût	...../	litrage /ha postfloral 3)	.....
Prénom	.....	Pulv. type	.....	Distance interlignes 2)	.....
Adresse	.....	Buses: marques	...../.....	Nombre de buses	.....
Lieu	.....	Buses: types	...../.....	Vitesse (compteur)	.....

2. Contrôle de la vitesse d'avancement du véhicule (pulvérisateur 1/2 plein) :

Type de véhicule .....:

Rapport engagé: ..... Moteur: ..... min.$^{-1}$ Vitesse sur route au compteur = ... km/h

Coefficient de patinage : ..... 5) x 92% = ... 1) **km /h.**

Vitesse réelle: 5)

50 m x 3,6 = ... km / h

temps [s]: .....

3a. Contrôle du débit total des buses :

$$\frac{1)\ \text{.....: km/h} \times 2)\ \text{.....: mètres} \times 3)\ \text{.....: litres}}{600} = \text{..... l/min total}$$

3b. Répartition verticale dans le sens de la marche. (Précision +/- 10%)

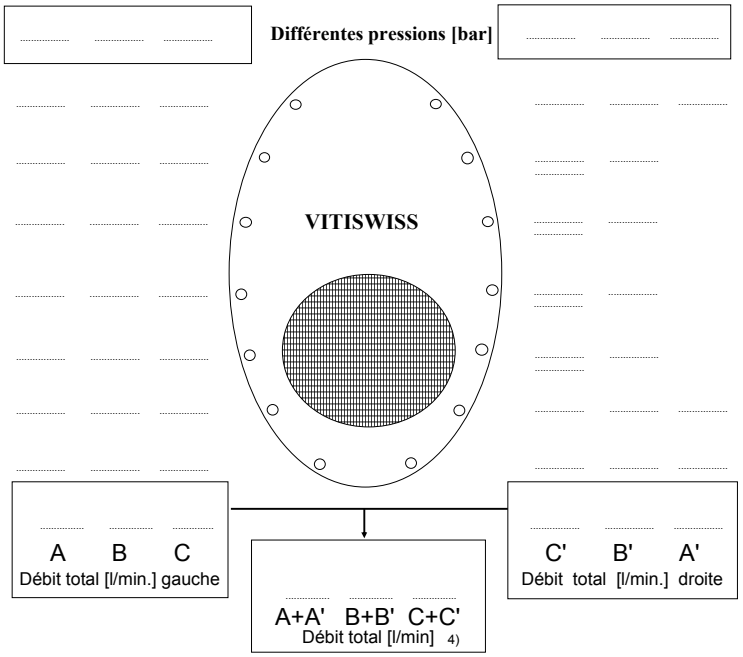

3c. Calcul du volume réel de bouillie / ha

$$\frac{\text{débit total: } 4)\ \text{.....: l/min} \times 600}{\text{Vitesse réelle: } 1)\ \text{.....: km/h} \times 2)\ \text{.....: mètres (Distance interligne)}}$$

Précision +/- 10%

..... **l/ha**

4. Remarques:

.....

5. Etat général de la machine pour la pulvérisation Entourer si défectueux

Réservoir - graduation - brasseur	Filtres d'aspiration - principal - de buses
Pompe - arbre à cardans - protection	Rampe + ventilateur - alignement - déflecteur
Buses - supports - types	Batterie de commande - réglage - débit/mètre
Manomètre - échelle - stabilité - exactitude	Etanchéité globale du système de pulvérisation

Le propriétaire est responsable en matière de signalisation routière

6. Libellé de l'autocontrôle

Le soussigné atteste que le pulvérisateur a bien été contrôlé conformément aux directives de VITISWISS

signature:

Nom .....

Prénom .....

Date du contrôle: ..... A présenter aux contrôles pré-vendanges pour obtenir l'effort particulier n° 21
